

Chapter 13: Project Stakeholder Management

Dự án Công nghệ Thông tin Project
Quản lý, ấn bản thứ bảy Edition



Information Technology
PROJECT MANAGEMENT | 7e

Kathy Schwalbe

Learning Objectives

Hiểu được tầm quan trọng của việc quản lý các bên liên quan trong dự án xuyên suốt vòng đời của dự án.

Thảo luận về quy trình xác định các bên liên quan, cách tạo sổ đăng ký các bên liên quan và cách thực hiện phân tích các bên liên quan.

Mô tả nội dung của kế hoạch quản lý các bên liên quan

Learning Objectives (cont'd)

Hiểu rõ quy trình quản lý sự tham gia của các bên liên quan và cách sử dụng nhật ký vấn đề một cách hiệu quả.

Giải thích các phương pháp kiểm soát sự tham gia của các bên liên quan

Thảo luận về các loại phần mềm có sẵn để hỗ trợ quản lý các bên liên quan trong dự án.

Importance of Project Stakeholder Management

Vì quản lý các bên liên quan rất quan trọng đối với sự thành công của dự án, nên Quản lý Dự án

Viện đã quyết định tạo ra một lĩnh vực kiến thức hoàn toàn riêng biệt dành cho nó như một phần của Phiên bản thứ năm của cuốn sách.

Hướng dẫn PMBOK® năm 2012

Mục đích của quản lý các bên liên quan trong dự án là xác định tất cả những người hoặc tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án, phân tích kỳ vọng của các bên liên quan và thu hút sự tham gia hiệu quả của các bên liên quan.

Projects Often Cause Change

Các dự án thường gây ra những thay đổi trong tổ chức, và một số người có thể mất việc khi dự án hoàn thành. Người quản lý dự án có thể bị coi là kẻ thù nếu dự án dẫn đến việc một số bên liên quan mất việc .

Ngược lại, họ có thể được xem là đồng minh nếu họ dẫn dắt một dự án giúp tăng lợi nhuận , tạo ra việc làm mới hoặc tăng lương cho một số bên liên quan nhất định.

Trong mọi trường hợp, người quản lý dự án phải học cách xác định, hiểu và làm việc với nhiều bên liên quan khác nhau.

What Went Wrong?

Việc thay đổi cách thức làm việc có thể gây ra cú sốc. Làn sóng này lan rộng trong một tổ chức, khiến nhiều người sợ hãi và thậm chí nghĩ đến cách ngăn chặn hoặc phá hoại dự án.

Donald White, người sáng lập và quản lý chương trình tại Defense Systems Leaders ở Washington, DC, đã mô tả các tình huống có thể dẫn đến phá hoại dự án:

Nỗi buồn khi mua hàng

Lợi nhuận ngắn hạn

Vượt trội

Thiếu tôn trọng

Project Stakeholder Management Processes


Xác định các bên liên quan: Xác định tất cả những người tham gia vào dự án hoặc bị ảnh hưởng bởi dự án, và xác định những cách tốt nhất để quản lý mối quan hệ với họ.

Lập kế hoạch quản lý các bên liên quan: Xác định các chiến lược để thu hút sự tham gia hiệu quả của các bên liên quan

Quản lý sự tham gia của các bên liên quan: Giao tiếp và làm việc với các bên liên quan của dự án để đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng của họ, giải quyết các vấn đề và thúc đẩy sự tham gia vào các quyết định và hoạt động của dự án.

Kiểm soát sự tham gia của các bên liên quan: Giám sát quan hệ với các bên liên quan và điều chỉnh kế hoạch và chiến lược để thu hút sự tham gia của các bên liên quan khi cần thiết.

Figure 13-1. Project Stakeholder Management Summary

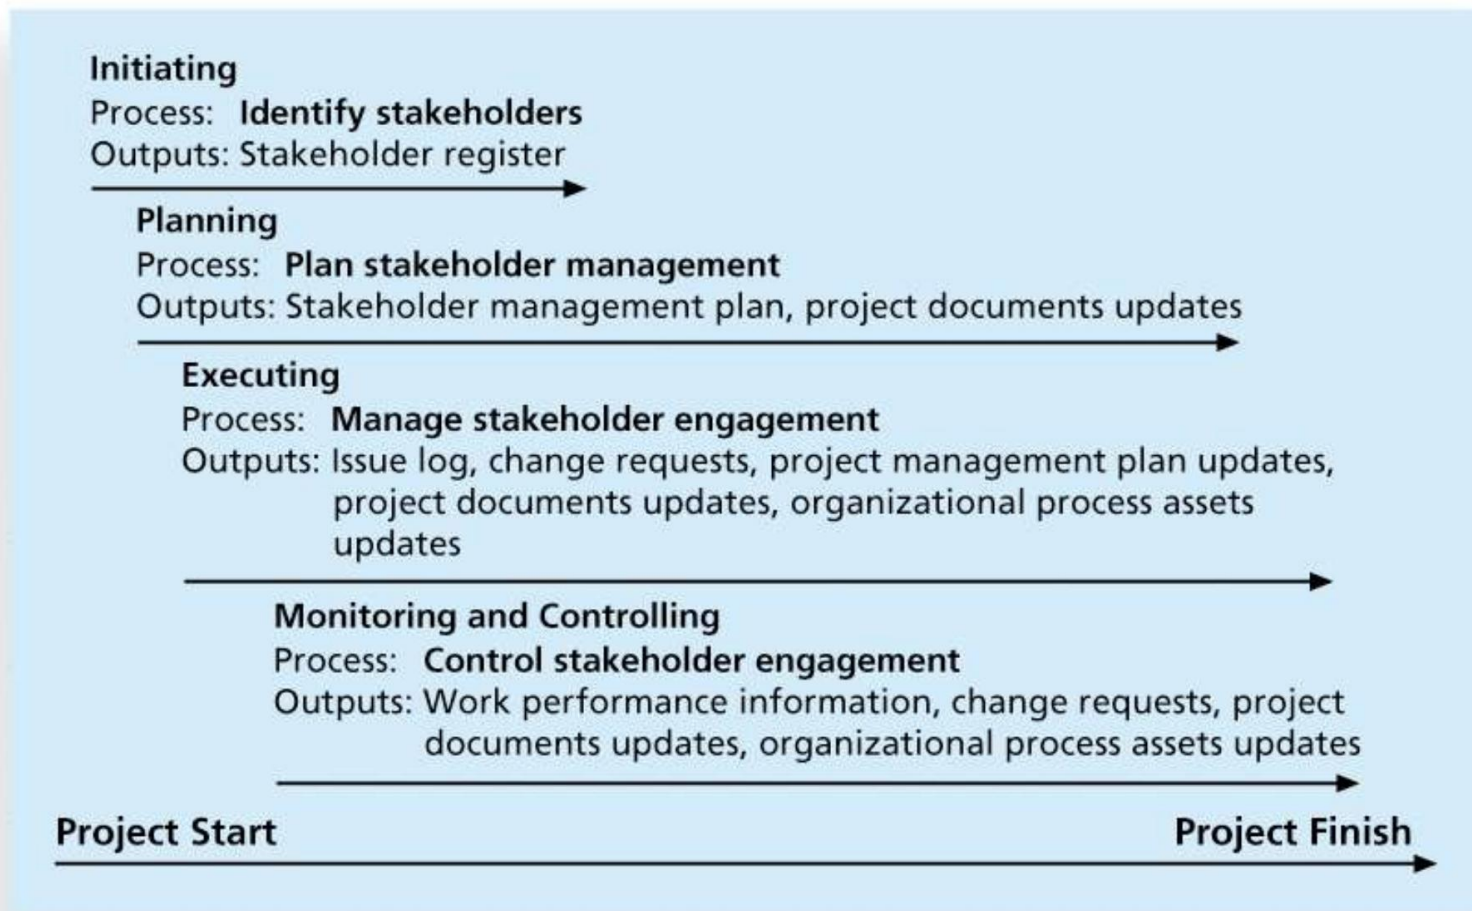

Identifying Stakeholders

Các bên liên quan nội bộ của dự án thường bao gồm nhà tài trợ dự án, nhóm dự án, nhân viên hỗ trợ và khách hàng nội bộ của dự án. Các bên liên quan nội bộ khác bao gồm ban lãnh đạo cấp cao, các nhà quản lý chức năng khác và các nhà quản lý dự án khác do các tổ chức có nguồn lực hạn chế.

Các bên liên quan bên ngoài dự án bao gồm khách hàng của dự án (nếu họ không thuộc tổ chức), đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp và các nhóm bên ngoài khác có khả năng tham gia hoặc bị ảnh hưởng bởi dự án, chẳng hạn như các quan chức chính phủ và công dân quan tâm.

Additional Stakeholders

www.projectstakeholder.com liệt kê các mục khác
các bên liên quan bao gồm:

Giám đốc chương trình

Gia đình của người quản lý dự án

Các công đoàn lao động

Khách hàng tiềm năng

Ngoài ra, cần tập trung vào các bên liên quan có mối liên hệ trực tiếp nhất với dự án, ví dụ như chỉ các nhà cung cấp chính.

Stakeholder Register

Sổ đăng ký các bên liên quan bao gồm thông tin cơ bản về các bên liên quan:

Thông tin nhận dạng: Tên, chức vụ, địa điểm, vai trò trong dự án và thông tin liên hệ của các bên liên quan.

Thông tin đánh giá: Các bên liên quan chính các yêu cầu và kỳ vọng, các yếu tố ảnh hưởng tiềm tàng và các giai đoạn của dự án mà các bên liên quan quan tâm nhất.

Phân loại các bên liên quan: Bên liên quan là bên nội bộ hay bên ngoài công ty?

Bên ngoài tổ chức? Bên liên quan đó là người ủng hộ dự án hay phản đối dự án?

Table 13-1. Sample Stakeholder Register


Name	Position	Internal/ External	Project Role	Contact Information
Stephen	VP of Operations	Internal	Project sponsor	stephen@globaloil.com
Betsy	CFO	Internal	Senior manager, approves funds	betsy@globaloil.com
Chien	CIO	Internal	Senior manager, PM's boss	chien@globaloil.com
Ryan	IT analyst	Internal	Team member	ryan@globaloil.com
Lori	Director, Accounting	Internal	Senior manager	lori@globaloil.com
Sanjay	Director, Refineries	Internal	Senior manager of largest refinery	sanjay@globaloil.com
Debra	Consultant	External	Project manager	debra@gmail.com
Suppliers	Suppliers	External	Supply software	suppliers@gmail.com

Classifying Stakeholders

Sau khi xác định các bên liên quan chính của dự án, bạn có thể sử dụng các mô hình phân loại khác nhau để xác định phương pháp quản lý mối quan hệ với các bên liên quan .

Có thể sử dụng ma trận quyền lực/lợi ích để nhóm các bên liên quan dựa trên mức độ thẩm quyền (quyền lực) và mức độ quan tâm (lợi ích) của họ đối với kết quả dự án.

Figure 13-2. Power/Interest Grid

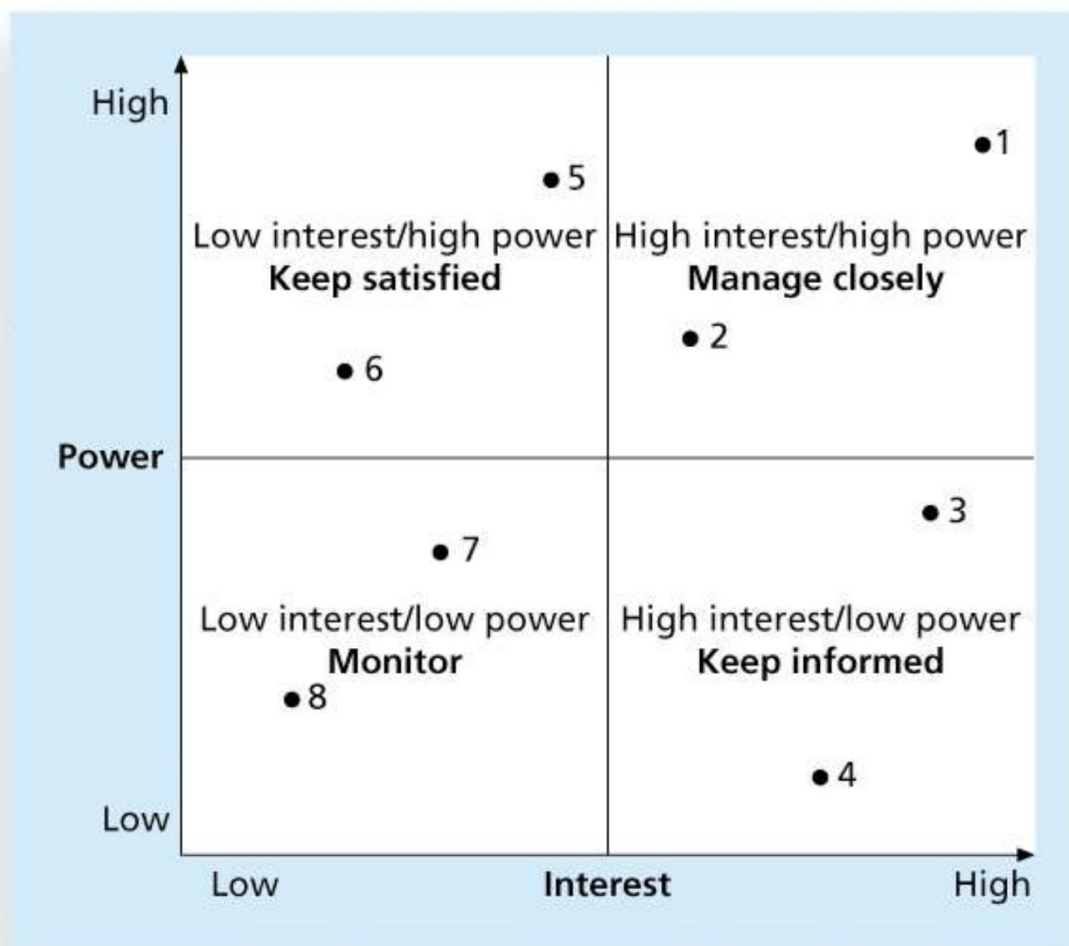

Stakeholder Engagement Levels

Không biết: Không biết về dự án và những tác động tiềm tàng của nó đối với họ.

Kháng cự: Nhận thức được dự án nhưng lại kháng cự sự thay đổi.

Trung lập: Nhận thức được dự án nhưng không ủng hộ cũng không phản đối.

Ủng hộ: Hiểu rõ dự án và ủng hộ dự án.
thay đổi

Lãnh đạo: Hiểu rõ dự án

What Went Right?

Thay vì chỉ nói "không" khi nhà tài trợ dự án yêu cầu điều gì đó không hợp lý, tốt hơn hết là bạn nên giải thích lý do tại sao yêu cầu đó không hợp lý, rồi đưa ra một giải pháp khả thi để giải quyết vấn đề.

Ví dụ, Christa Ferguson, một chuyên gia PMP và quản lý chương trình độc lập tại San Francisco, đã mô tả cách cô ấy xử lý yêu cầu từ nhà tài trợ dự án về việc giao một thiết bị máy tính bảng mới **trong** vòng hai tháng, trong khi cô ấy biết mình cần nhiều thời gian hơn. Dựa trên kinh nghiệm của mình, cô ấy biết rằng chỉ riêng việc lập yêu cầu báo giá (RFQ) cho công việc này đã mất gần một tháng. Christa nhanh chóng nghiên cứu các thông tin để đề xuất một lịch trình giao hàng thực tế.

Nhà tài trợ dự án đã điều chỉnh lại kỳ vọng sau khi biết được những công đoạn cần thiết để sản xuất ra những chiếc máy tính bảng.

Planning Stakeholder Management

Sau khi xác định và phân tích các bên liên quan, nhóm dự án nên xây dựng kế hoạch quản lý các bên này .

Kế hoạch quản lý các bên liên quan có thể bao gồm:

- Mức độ tham gia hiện tại và mong muốn

- Mối quan hệ tương tác giữa các bên liên quan

- Yêu cầu về giao tiếp

- Các chiến lược quản lý tiềm năng cho từng bên liên quan

- Các phương pháp cập nhật kế hoạch quản lý các bên liên quan

Sensitive Information

Bởi vì kế hoạch quản lý các bên liên quan thường
Nếu nội dung đó chứa thông tin nhạy cảm, nó không nên được
đưa vào các tài liệu chính thức của dự án, vốn
thường được cung cấp cho tất cả các bên liên quan xem xét.

Trong nhiều trường hợp, chỉ có người quản lý dự án và một
vài thành viên khác trong nhóm mới nên chuẩn bị
kế hoạch quản lý các bên liên quan.

Một số phần của kế hoạch quản lý các bên liên quan không
được ghi chép lại, và nếu có, việc phân phối cũng bị hạn
chế nghiêm ngặt.

Table 13-2. Sample Stakeholder Analysis

Name	Power/ Interest	Current Engagement	Potential Management Strategies
Stephen	High/high	Leading	Stephen can seem intimidating due to his physical stature and deep voice, but he has a great personality and sense of humor. He previously led a similar refinery upgrade program at another company and knows what he wants. Manage closely and ask for his advice as needed. He likes short, frequent updates in person.
Chien	High/ medium	Resistant	Chien is a very organized yet hardheaded man. He has been pushing corporate IT standards, and the system the PM and sponsor (Debra and Stephen) like best goes against those standards, even though it's the best solution for this project and the company as a whole. Need to convince him that this is okay and that people still respect his work and position.
Ryan	Medium/ high	Supportive	Ryan has been with the company for several years and is well respected, but he feels threatened by Debra. He also resents her getting paid more than he does. He wants to please his boss, Chien, first and foremost. Need to convince him that the suggested solution is in everyone's best interest.
Betsy	High/low	Neutral	Very professional, logical person. Gets along well with Chien. She has supported Debra in approving past projects with strong business cases. Provide detailed financial justification for the suggested solution to keep her satisfied. Also ask her to talk to Chien on Debra's behalf.

Managing Stakeholder Engagement

Thành công của dự án thường được đo lường dựa trên sự hài lòng của khách hàng/nhà tài trợ.

Các nhà tài trợ dự án thường xếp hạng theo phạm vi, thời gian và chi phí. các mục tiêu được sắp xếp theo thứ tự quan trọng và cung cấp hướng dẫn về cách cân bằng ba ràng buộc.

Bảng xếp hạng này có thể được thể hiện trong ma trận quản lý kỳ vọng để giúp làm rõ các kỳ vọng.

Table 13-3. Expectations Management Matrix

Measure of Success	Priority	Expectations	Guidelines
Scope	1	The scope statement clearly defines mandatory requirements and optional requirements.	Focus on meeting mandatory requirements before considering optional ones. In this case, following corporate IT standards is optional.
Time	1	There is little give in the project completion date. The schedule is very realistic.	The project sponsor must be alerted if any issues might affect meeting schedule goals.
Cost	3	This project is crucial to the organization. If you can clearly justify the need for more funds, they can be made available.	There are strict rules for project expenditures and escalation procedures. Cost is very important, but it takes a back seat to meeting schedule and then scope goals.
Technology/standards	2	There are several potential solutions available, but only one that meets all of the sponsor's technical requirements, especially for accounting.	While corporate IT standards are important, an exception makes sense in this case.

Issue Logs

Hiểu được kỳ vọng của các bên liên quan có thể giúp quản lý các vấn đề.

Các vấn đề cần được ghi lại trong nhật ký sự cố, một công cụ được sử dụng để ghi chép, giám sát và theo dõi các vấn đề cần giải quyết.

Các vấn đề chưa được giải quyết có thể là nguồn gốc chính của xung đột và dẫn đến việc không đáp ứng được kỳ vọng của các bên liên quan.

Nhật ký sự cố có thể đề cập đến các lĩnh vực kiến thức khác như
Tốt

Table 13-4. Sample Issue Log

Issue #	Description	Impact	Date Reported	Reported By	Assigned To	Priority (H/M/L)	Due Date	Status	Comments
1	Need requirements categorized as mandatory and optional	Cannot do much without it	Feb. 4	Ryan	Stephen	H	Feb. 8	Closed	Requirements clearly labeled
2	Need shorter list of potential suppliers—no more than 10	Will delay evaluation without it	Feb. 6	Debra	Ryan	H	Feb. 12	Open	Almost finished; needed requirements categorized first
Etc.									

Best Practice

Các nhà quản lý dự án thường phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là trong việc quản lý các bên liên quan.

Đôi khi họ đơn giản là không thể đáp ứng các yêu cầu từ các bên liên quan quan trọng.

Một số gợi ý để xử lý các tình huống này bao gồm:

Hãy làm rõ ngay từ đầu

Giải thích hậu quả

Hãy có kế hoạch dự phòng

Tránh những điều bất ngờ

Hãy đứng lên bảo vệ lập trường của mình

Controlling Stakeholder Engagement

Bạn không thể kiểm soát các bên liên quan, nhưng bạn có thể kiểm soát mức độ tham gia của họ.

Sự tham gia bao gồm một cuộc đối thoại trong đó mọi người tìm kiếm sự hiểu biết và giải pháp cho các vấn đề cùng quan tâm.

Nhiều giáo viên đã quen thuộc với nhiều kỹ thuật khác nhau để thu hút học sinh.

Điều quan trọng là phải tạo được ấn tượng tốt ngay từ đầu.
một lớp học hoặc dự án

Example of Engaging or Not Engaging Students (or Other Stakeholders)

Nếu giáo viên (hoặc người quản lý) chỉ giảng bài suốt ngày đầu tiên của lớp học (hoặc trong các cuộc họp) hoặc chỉ trích người đầu tiên đưa ra ý kiến, sinh viên (hoặc nhân viên) sẽ nhanh chóng quyết định rằng chiến lược tốt nhất của họ là giữ im lặng và thậm chí có thể không tham dự lớp học (hoặc cuộc họp).

Ngược lại, nếu giáo viên (hoặc người quản lý) sử dụng nhiều hoạt động để khuyến khích tất cả người tham gia phát biểu hoặc sử dụng công nghệ để tham gia , họ sẽ kỳ vọng trở thành những người tham gia tích cực trong các lớp học (hoặc cuộc họp) sau này.

Media Snapshot

Nhiều học sinh ngày nay thích giao tiếp qua tin nhắn văn bản. Ellen DeGeneres, một nữ diễn viên hài nổi tiếng với chương trình truyền hình riêng, thích châm biếm tin nhắn văn bản trong một tiết mục dựa trên những lỗi hài hước do tính năng tự động sửa lỗi của điện thoại di động gây ra. Ví dụ, một người cha đã có cuộc trao đổi tin nhắn sau với con gái mình:



Media Snapshot (continued)

Bên cạnh việc chú ý đến các lỗi tự động sửa chính tả khi nhắn tin, người dùng cũng phải cẩn thận với người mình trả lời và nội dung thư trả lời.

Xem phần văn bản để biết ví dụ từ một sinh viên đại học thực tế đã quên mất bài kiểm tra. Giáo sư đã gọi điện thoại di động cho sinh viên đó ngay sau khi kỳ thi bắt đầu. Quy định của giáo sư là cho điểm 0 nếu sinh viên vắng mặt mà không có lý do chính đáng.

Sinh viên đó không nghe điện thoại, nhưng đã gửi nhiều tin nhắn, rõ ràng là không đúng sự thật.

Ways to Control Engagement

Các bên liên quan chính nên được mời tham gia tích cực. Tham gia tích cực vào cuộc họp khởi động thay vì chỉ đơn thuần tham dự.

Người quản lý dự án nên nhấn mạnh rằng a Cuộc họp dự kiến sẽ có sự đối thoại, bao gồm cả văn bản hoặc bất kỳ phương tiện liên lạc nào mà các bên liên quan ưa thích. Người quản lý dự án cũng nên gặp gỡ các bên liên quan quan trọng trước cuộc họp khởi động.

Lịch trình dự án cần bao gồm các hoạt động và Các sản phẩm đầu ra liên quan đến việc thu hút sự tham gia của các bên liên quan, chẳng hạn như khảo sát, đánh giá, trình diễn và phê duyệt.

Stakeholders As Key Project Team Members

Trong một số dự án CNTT, các bên liên quan quan trọng được mời tham gia vào nhóm dự án.

Ví dụ, khi hãng hàng không Northwest Airlines (nay là Delta) đang phát triển một hệ thống đặt chỗ mới có tên gọi là...

ResNet đã phỏng vấn các nhân viên đặt chỗ cho các vị trí lập trình viên trong nhóm dự án.

Northwest đảm bảo rằng nhu cầu của người dùng được đáp ứng. được hiểu bằng cách để họ trực tiếp phát triển giao diện người dùng của hệ thống.

Using Software to Assist in Project Stakeholder Management

Phần mềm năng suất, phần mềm truyền thông và công cụ cộng tác có thể thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan.

Mạng xã hội cũng có thể giúp thu hút sự tham gia của các bên liên quan.

Ví dụ, LinkedIn có hàng ngàn nhóm dành cho các chuyên gia quản lý dự án.

Một số phần mềm quản lý dự án có chức năng tương tự như của Facebook, khuyến khích xây dựng mối quan hệ trong dự án, ví dụ như khen ngợi và tán thưởng khi hoàn thành tốt công việc.

Social Media for Project Managers

Elizabeth Harrin, tác giả của cuốn sách "Social Media for Project"
Bài viết này, với tiêu đề "Các nhà quản lý", mô tả ưu điểm và
nhược điểm của một số công cụ truyền thông xã hội, bao gồm
blog, công cụ cộng tác, nhắn tin tức thời, tiểu blog như Twitter, v.v.
Facebook, podcast, RSS, mạng xã hội, vodcast (podcast
video), hội thảo trực tuyến và wiki.

Harrin đưa ra lời khuyên về thời điểm nên sử dụng mạng xã hội và
thời điểm không nên sử dụng.

Như người ta vẫn nói, "Kẻ ngốc có công cụ vẫn chỉ là kẻ ngốc." Nhiều
hoạt động thu hút sự tham gia của các bên liên quan đòi hỏi những
kỹ thuật truyền thống như trò chuyện trực tiếp với ai đó !

Global Issues

Không phải tất cả các dự án triển khai phần mềm đều diễn ra suôn sẻ, và việc quản lý các bên liên quan là một thách thức lớn.

Chính phủ Anh đã hủy bỏ khoản đầu tư 11,4 tỷ bảng Anh. Sáng kiến công nghệ thông tin y tế quốc gia đã bị hủy bỏ vào tháng 9 năm 2011 sau khi không mang lại những lợi ích như đã hứa. Đáng tiếc là, dự án này chỉ là một trong chuỗi những thất bại nổi bật ở Vương quốc Anh.

Để đối phó, chính phủ đã quyết định cử các nhà quản lý dự án của mình quay lại trường học! Họ hợp tác với Đại học Oxford và công ty tư vấn Deloitte để thành lập Học viện Lãnh đạo Dự án Lớn tại Oxford, Anh .

Chapter Summary

Quản lý các bên liên quan hiện là lĩnh vực kiến thức thứ mười trong Hướng dẫn PMBOK®.

Các quy trình bao gồm:

- Xác định các bên liên quan

- Lập kế hoạch quản lý các bên liên quan

- Quản lý sự tham gia của các bên liên quan

- Kiểm soát sự tham gia của các bên liên quan
